



Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä




Työturvallisuus

- TR-mittaus, työmaan tavoite 95,0 %

TR-keskiarvo
Viimeisin mittaus
Korjaamattomia havainnot

96.18%
18.12.2024
12 kpl



☐ Turvallisuushavainnot

☒ TR

☐ Työturva

Tapaturmattomat työpäivät

⇒ 142 kpl



12 / 2024

Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Työmaatilanne

Valmistuneet työvaiheet

- Betonirunko 1–2 krs
- Teräsristikot
- Työnaikainen lämmitys aloitettu

Käynnissä olevat työvaiheet


- Ullakon höyrynsulku kermin asennus
- Puuelementtien asennus
- Sisäpuolen radonputkisto ja viemäröinti
- Sisäpuolen kapillaaritäyttö

Alkavat työvaiheet

- Puuelementtikatto
- Lattiaeristeet
- Maanvaraiset betonilattiat
- Vesikattotyöt

Aikataulu

- Ote yleisaikataulusta

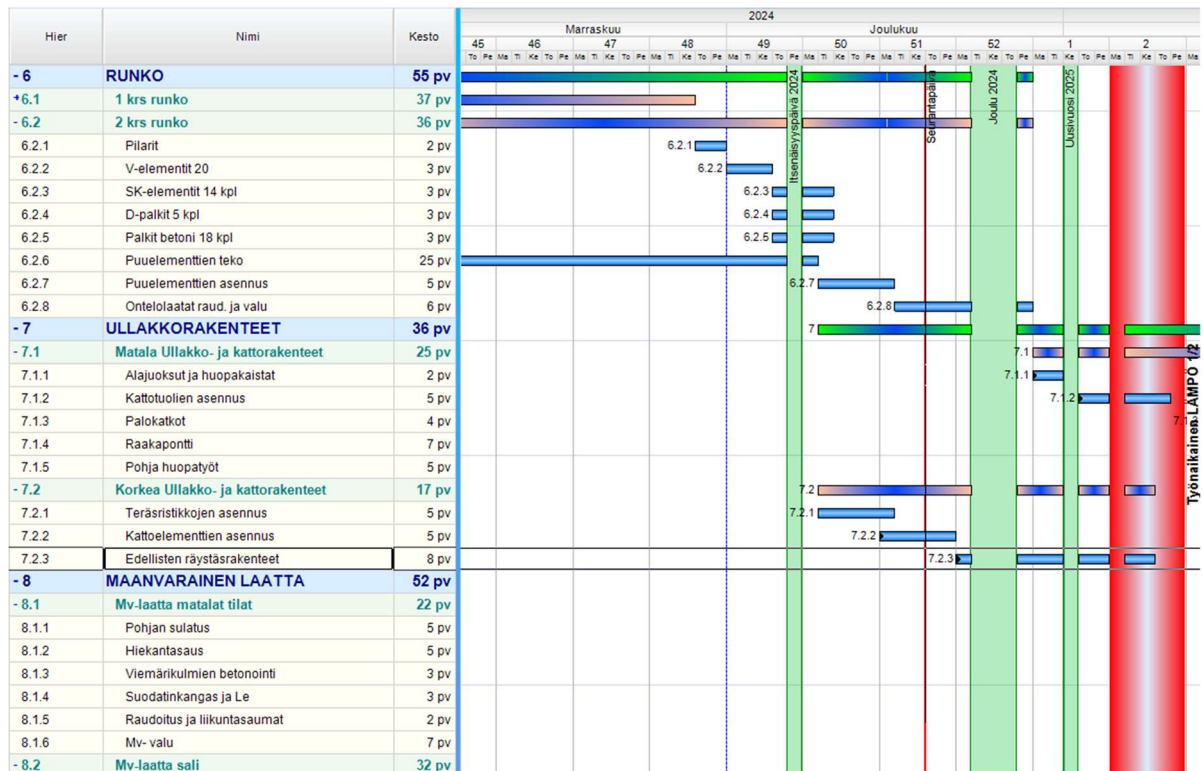





12 / 2024

Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Valokuvia työmaasta

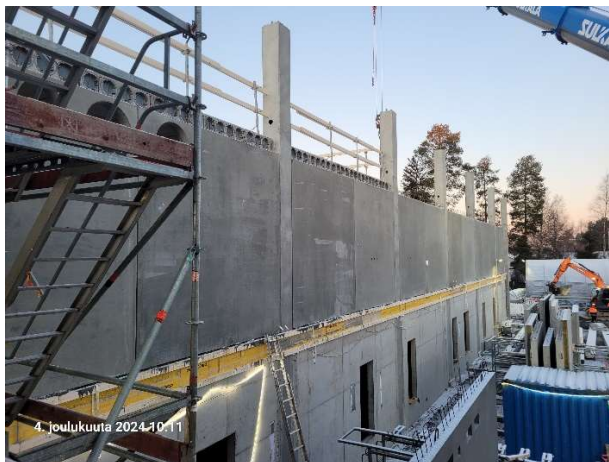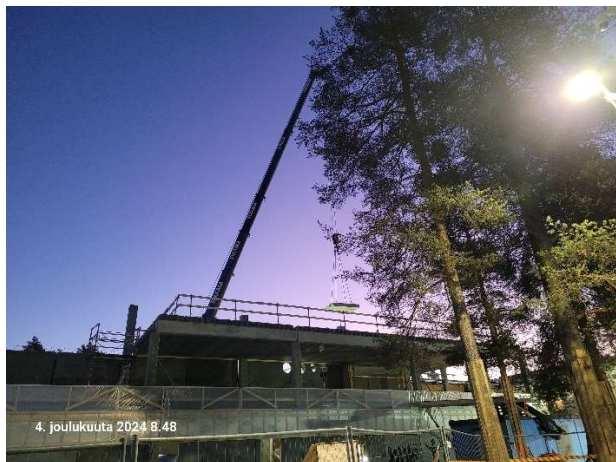



Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

